


公立沖縄北部医療センター 整備の進捗について

令和 7 年 7 月 16 日協議会
公立沖縄北部医療センター整備協議会事務局
(沖縄県北部医療組合)

1 実施設計及び造成設計の進捗について

① 設計スケジュール

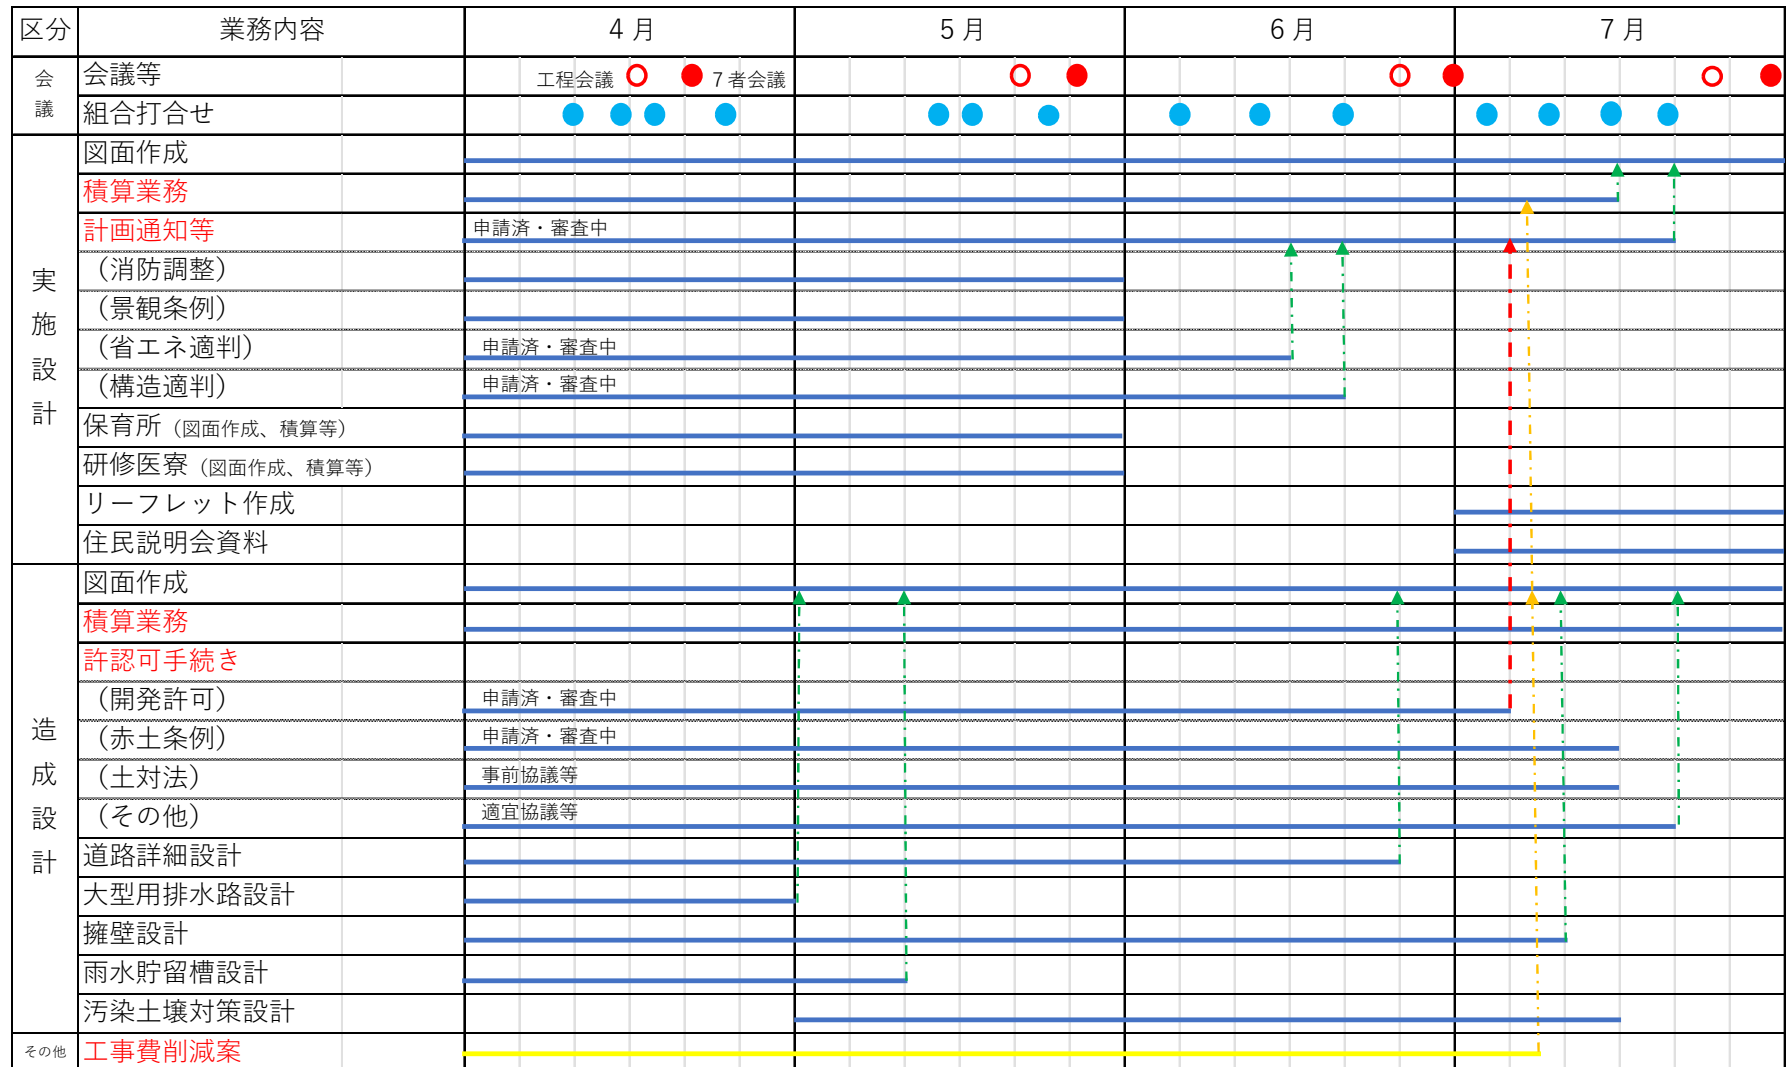

1 実施設計及び造成設計の進捗について

② 設計における課題等

- 開発許可及び計画通知について
 - ・ 開発許可及び計画通知について、県建築指導課において審査中。
- 建設費等の削減について
 - ・ 物価高騰や技術者不足等の影響により、予定建設費が増額となっているため、病院機能に影響がない範囲で削減に努めているが、今後可能な限り削減についての検討を行う。
- 引き続き名護市と協議が必要な事項
 - ・ 下水道の接続について
 - ・ 大型用排水路の引き渡し方法等について
 - ・ 敷地内の里道の等価交換方法等について
- 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の対策について
 - ・ 形質変更時要届出区域に指定された箇所の汚染土壌の処理方法等について、県環境部と調整が必要。
- 住民説明会について
 - ・ 開催の時期や箇所、開催方法等について、今後検討を行う。

2 工事の発注等について

① 工事の発注区分及びスケジュールについて

区分	工事名称（仮称）	入札方式	入札参加資格要件
本体	公立沖縄北部医療センター建設工事（建築）	総合評価（標準型）	建築工事業 3者 J V 県の入札参加資格者で一定の評定点以上の者 1者 + 県内特 A 2者 （一定の評点以上の業者は県外及び県内の上位 4 社程度を想定）
	公立沖縄北部医療センター建設工事（電気）	総合評価（標準型）	電気工事業 3者 J V 県の入札参加資格者で一定の評定点以上の者 1者 + 県内 A 2者 （一定の評点以上の業者は県外の業者を想定）
	公立沖縄北部医療センター建設工事（機械）	総合評価（標準型）	管工事業 3者 J V 県の入札参加資格者で一定の評定点以上の者 1者 + 県内 A 2者 （一定の評点以上の業者は県外の業者を想定）
造成	公立沖縄北部医療センター建設工事（造成・第 1 期）	総合評価（特別簡易）	土木工事業 2者 J V 県内に本社のある特 A 等級 1者 + 北部管内に本社のある A 等級 1者
	公立沖縄北部医療センター建設工事（造成・第 2 期）	総合評価（特別簡易）	土木工事業 3者 J V 県内に本社のある特 A 等級 3者
保育所	公立沖縄北部医療センター建設工事（保育所・建築）	一般競争	建築工事業 2者 J V 県内に本社のある特 A 等級 1者 + 北部管内に本社のある A 等級 1者
	公立沖縄北部医療センター建設工事（保育所・設備）	一般競争	管工事業 単独 北部管内に本社のある A 等級 1者

工事名称（仮）	手続き	R 7											R 8				R 9				R 10			
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	1/4	2/4	3/4	4/4	
公立沖縄北部医療センター建設工事 （造成・第 1 期）	審査会		●	●																				
	公告入札等		● 工事																					
公立沖縄北部医療センター建設工事 （建築）（電気）（機械）	審査会		●		●																			
	公告入札等		● 工事																					
公立沖縄北部医療センター建設工事 （造成・第 2 期）	審査会												●	●										
	公告入札等												● 工事		● 工事									
公立沖縄北部医療センター建設工事 （保育所・建築）（保育所・設備）	審査会															●	●							
	公告入札等															● 工事		● 工事						

2 工事の発注等について

② 工事発注のイメージ図について

